

 شركة طرق الرياض للمقاولات RIYADH ROAD CONTRACTING CO.	 أمانة جدة	 مكتب رمك للاستشارات الهندسية Office Ramak For Engineering Consultancy تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع info@ramakcompany.com 055617166 054471479				
المقاول	وكاله التعمير و المشاريع	الاستشاري				
شركة طرق الرياض للمقاولات	الاداره العامه للتنفيذ و الاشراف اداره تنفيذ الطرق	مكتب رمك للإستشارات الهندسية				
☒ تكديم جديد ☐ اعادة تكديم	مشروع تلال الغروب	الاعمال المساحيه و الترابيه				
رقم المخطط: BLOCK03 : رقم الشارع: ROAD 04 : عرض الشارع: 18 اسم الحي: الامير فواز الى محطة رقم: 240.92+0 : 000+0 : استلام الطبقة: BOTTOM SUBGRADE						
اعمال اخرى :						
التاريخ: 12/10/2024 0:00 : توقيع مهندس الموقع :						
☐ المراقب ☐ المخبتر توقيع المهندس المشرف:	☐ المساح 	☐ مرئيات المراقبة : ☒ جاهز ☐ غير جاهز				
ملاحظات :						
نتيجة تدقيق المساحة : من المحطة : 240.92+0 الى المحطة : 240.92+0 من المحطة : الى المحطة : مرفقات : ☐ القطاع الطولي ☐ القطاع العرضي ☐ اخري ☒ متطابق ☐ غير متطابق						
ملاحظات : التاريخ: / / : التوقيع:						
من محطة : الى محطة : توقيع المساح : التاريخ: / / :						
نتيجة تدقيق المواد: تصنيف المواد : ☐ مرفق ☐ قيمه البركتور : الرطوبه المثلي : ☐ غير مرفق						
رقم الاختبار	رقم المحطة	نوعية المواد	نسبة الدك	نسبة الرطوبة	النتيجة	ملاحظات
النتيجة : ☐ ناجح ☐ راسب ☐ التوقيع : التاريخ: / / :						
ملاحظات: تعليمات المهندس الاستشاري : موافق ☐ غير موافق ☐ التوقيع:						
تم الاستلام : مندوب المقاول : التاريخ: / / :						



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع
info@ramakcompany.com - 0556157166 - 05443714479 - الدوحة



شركة طريق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING

المقاول :- شركة طرق الرياض للمقاولات				الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف إدارة تنفيذ الطرق				الإستشاري :- مكتب رمك للإستشارات الهندسية			
تقرير إستلام طبقة ردم											
ROAD-B03-4 240.92M 18		رقم الشارع :- طول الشارع :- عرض الشارع :-		تلال الغروب BLOCK03 BOUOTTOM OF SUPGRADE-1		اسم المشروع :- رقم المخطط :- رقم الطبقة :-					
		WIDHT-R WIDHT-L		9.000 9.000		LAYAER THICKNESS DEOTH FROM TOP SUB.G		0.150 0.000			
PVI	Station	Easting	Northing	L		C.L	R	CL width from L	CL width from R		
SLOPE				1.50%	-1.50%	0.00%	-2.00%				
				5.500	-3.500	0.000	3.000				
1	0	530068.810	2369266.993	58.188	58.105	58.150	58.090	9.000	9.000		
2	12.5	530080.351	2369262.193	58.371	58.288	58.333	58.273	9.000	9.000		
3	25	530091.893	2369257.393	58.557	58.474	58.519	58.459	9.000	9.000		
4	37.5	530103.434	2369252.592	58.745	58.662	58.707	58.647	9.000	9.000		
5	50	530114.976	2369247.792	58.937	58.854	58.899	58.839	9.000	9.000		
6	62.5	530126.517	2369242.992	59.130	59.047	59.092	59.032	9.000	9.000		
7	75	530138.059	2369238.191	59.323	59.240	59.285	59.225	9.000	9.000		
8	87.5	530149.600	2369233.391	59.517	59.434	59.479	59.419	9.000	9.000		
9	100	530161.142	2369228.591	59.718	59.635	59.680	59.620	9.000	9.000		
10	112.5	530172.683	2369223.790	59.923	59.840	59.885	59.825	9.000	9.000		
11	125	530184.225	2369218.990	60.133	60.050	60.095	60.035	9.000	9.000		
12	137.5	530195.766	2369214.190	60.344	60.261	60.306	60.246	9.000	9.000		
13	150	530207.308	2369209.389	60.553	60.470	60.515	60.455	9.000	9.000		
14	162.5	530218.881	2369204.667	60.714	60.668	60.713	60.653	9.000	9.000		
15	175	530230.847	2369201.080	60.902	60.855	60.900	60.840	9.000	9.000		
16	187.5	530243.020	2369198.922	61.049	61.031	61.076	61.016	9.000	9.000		
17	200	530249.144	2369209.453	61.279	61.196	61.250	61.190	9.000	9.000		
18	212.5	530260.501	2369208.437	61.453	61.370	61.424	61.364	9.000	9.000		
19	225	530272.042	2369203.635	61.627	61.544	61.598	61.538	9.000	9.000		
20	237.5	530283.583	2369198.833	61.801	61.718	61.772	61.712	9.000	9.000		
الإستشاري								المقاول			
مكتب رمك للإستشارات الهندسية								شركة طرق الرياض للمقاولات			
الإسم :- م/ فاضل محمد								الإسم :-			
التوقيع :-								التوقيع :-			
التاريخ :-								التاريخ :- 12/12/2024			



In-place Density and Water Content of Soil by EDG

Project	تنفيذ اعمال البنية التحتية	Report No.	PRO-240463.59
Client	شركة طرق الرياض للمقاولات	Testing Date	12-10-24
Location	جدة - حي الامير فواز - مخطط تلال الغروب	Sample By	Sumon
Test Apparatus	WINTESTING EDG-WS	Ref.	ASTM D 7698

Layer	Sub Grade
Location	Block 03 Street 04 Sta. 0+000 to Sta. 0+240

FIELD TEST RESULTS						
TEST NO.	LOCATION	wet denisty	dry denisty	water content	compaction	percent req.
		kg/m3	kg/m3	%	%	%
1	0+020	2.340	2.206	6.1	98.4	
2	0+095	2.326	2.194	6.0	97.9	
3	0+145	2.354	2.225	5.8	99.3	
4	0+210	2.350	2.210	6.3	98.6	

M.D.D = 2.241 kg/m3
O.M.C = 6.48 %

The lab is responsible of all information provided in this report , unless this information is given by the client

*These results are for the tested materials and tested locations only.

The lab is not responsible of sampling, sample is tested as received.


The report will not be re issued until authorized by the lab management, Lab is not responsible about the sample after two weeks of the test reoport date.

Checked by 



Approved by 



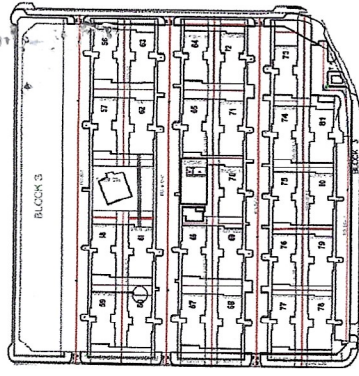

اتجاه صرف المياه
الارض الطبيعية
الخط التصيفي
اسفلت قاتم
الملكة البرية السعودية
امانة مدينة جدة
مديرية هندسة الطرق
البلدية - جدة

المالك / وزارة الاسكان




المطور / شركة سافى التجارية



الاستشاري العام / الابنية للاستشارات الهندسية



الاستشاري / مكتب ريم للاستشارات الهندسية



المقاول / شركة طرق الرياض للمقاولات



تصاميم الطرق لمشروع طلال الشروب
بحى الأمير فواز شمال - مدينة جدة
BLOCK-03

مساحة	1350
تاريخ	1350
رسم	GENERAL LAYOUT PLAN
رقم	3
موقع	موقع الدواير والتصاميم

مدير الادارة / مدير عام التصميم والطرق

BLOCK 3

RO-B03-1

RO-B03-2

RO-B03-3

RO-B03-4

